

Vorprojekt Datenrettung meineimpfungen

Sitzung Projektausschuss

30.09.2022
15:00 Uhr

Teams

Stammgemeinschaft eHealth Aargau

Laurenzenvorstadt 11

5000 Aarau



Agenda



1	Begrüssung und Vorstellung	15:00 – 15:10
2	Ziele	15:10 – 15:15
3	Vorstellung Projekt	15:15 – 15:35
4	Aktueller Stand	15:35 – 15:40
5	Nächste Schritte	15:40 – 15:50
6	Varia	15:50 – 16:00

Agenda



1	Begrüßung und Vorstellung	15:00 – 15:10
2	Ziele	15:10 – 15:15
3	Vorstellung Projekt	15:15 – 15:35
4	Aktueller Stand	15:35 – 15:40
5	Nächste Schritte	15:40 – 15:50
6	Varia	15:50 – 16:00

Begrüßung / Vorstellung

- Roger Lehner (Kanton Aargau)
- Magdalena Wicki (GDK)
- Nassima Mehira (BAG)
- Patrice Hof (Stammgemeinschaften)



Agenda



1	Begrüssung und Vorstellung	15:00 – 15:10
2	Ziele	15:10 – 15:15
3	Vorstellung Projekt	15:15 – 15:35
4	Aktueller Stand	15:35 – 15:40
5	Nächste Schritte	15:40 – 15:50
6	Varia	15:50 – 16:00

Ziele



- Der Projektausschuss ist über den Projektstand informiert
- Der Projektausschuss ist über die weiteren Schritte informiert
- Abstimmung und Abstützung des Projekts

Agenda



1	Begrüssung und Vorstellung	15:00 – 15:10
2	Ziele	15:10 – 15:15
3	Vorstellung Projekt	15:15 – 15:35
4	Aktueller Stand	15:35 – 15:40
5	Nächste Schritte	15:40 – 15:50
6	Varia	15:50 – 16:00

Ziele Projekt




- Das **primäre Ziel** des Projekts ist es aufzuzeigen, unter welchen Rahmenbedingungen und Annahmen eine **Auslieferung der Impf-Daten (380'000)** aus meineimpfung.ch an die Bürgerinnen und Bürger machbar ist. Das Projekt liefert die **Entscheidungsgrundlage**, um alle oder Teile der Daten meineimpfungen zurückzugeben oder sie definitiv zu löschen.

- Zusätzlich zeigt das Projekt auf, ob und wie **Zusatznutzen** für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden kann, indem Bürger ihre **Impfdaten** aus meineimpfungen in ihr persönliches elektronisches Patientendossier (EPD) übertragen können. Diese Option ist für die Bürger ausdrücklich **freiwillig** und **unabhängig von einer Datenrückgabe** oder Datenlöschung.

Fokus



- Daten aus der ganzen Schweiz
- Lösung für alle Bürgerinnen und Bürger, die ein Dossier haben
- Hauptprojekt muss breit abgestützt und mitgetragen werden

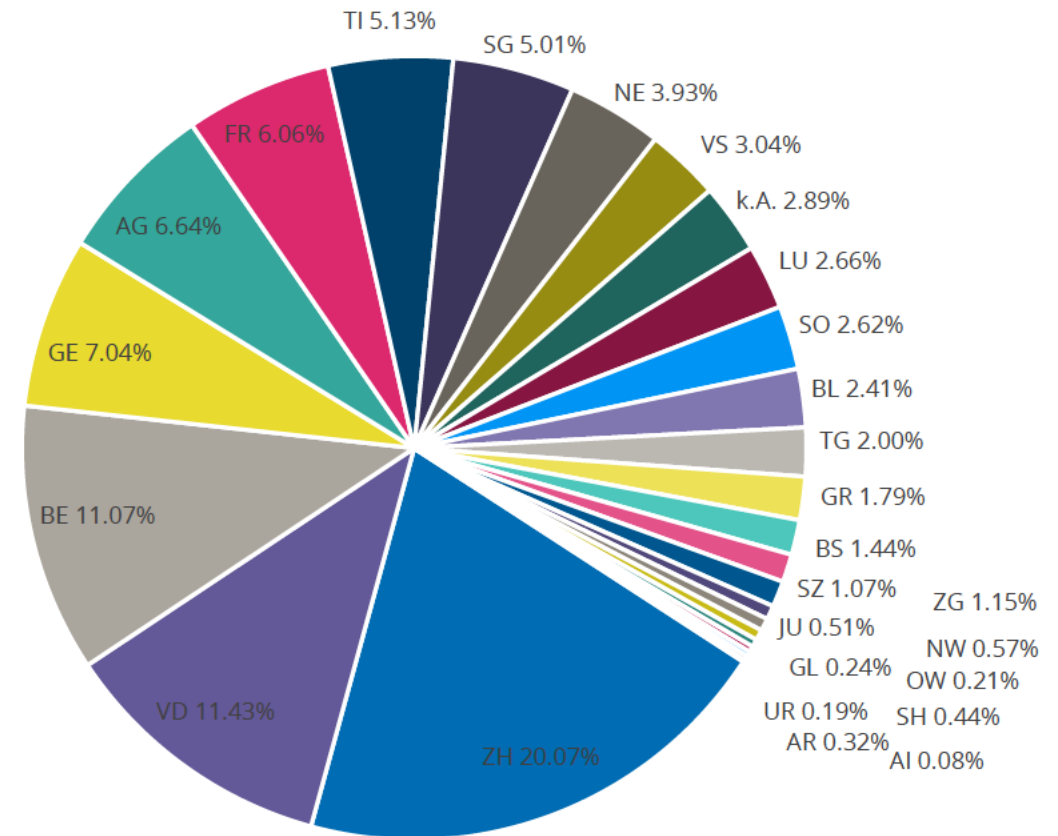

Stand Februar 2020


Fokus



- > 5 Mio Datensätze (Stand 02/2020)
- Ca. 18 Einträge pro User



Projektorganisation

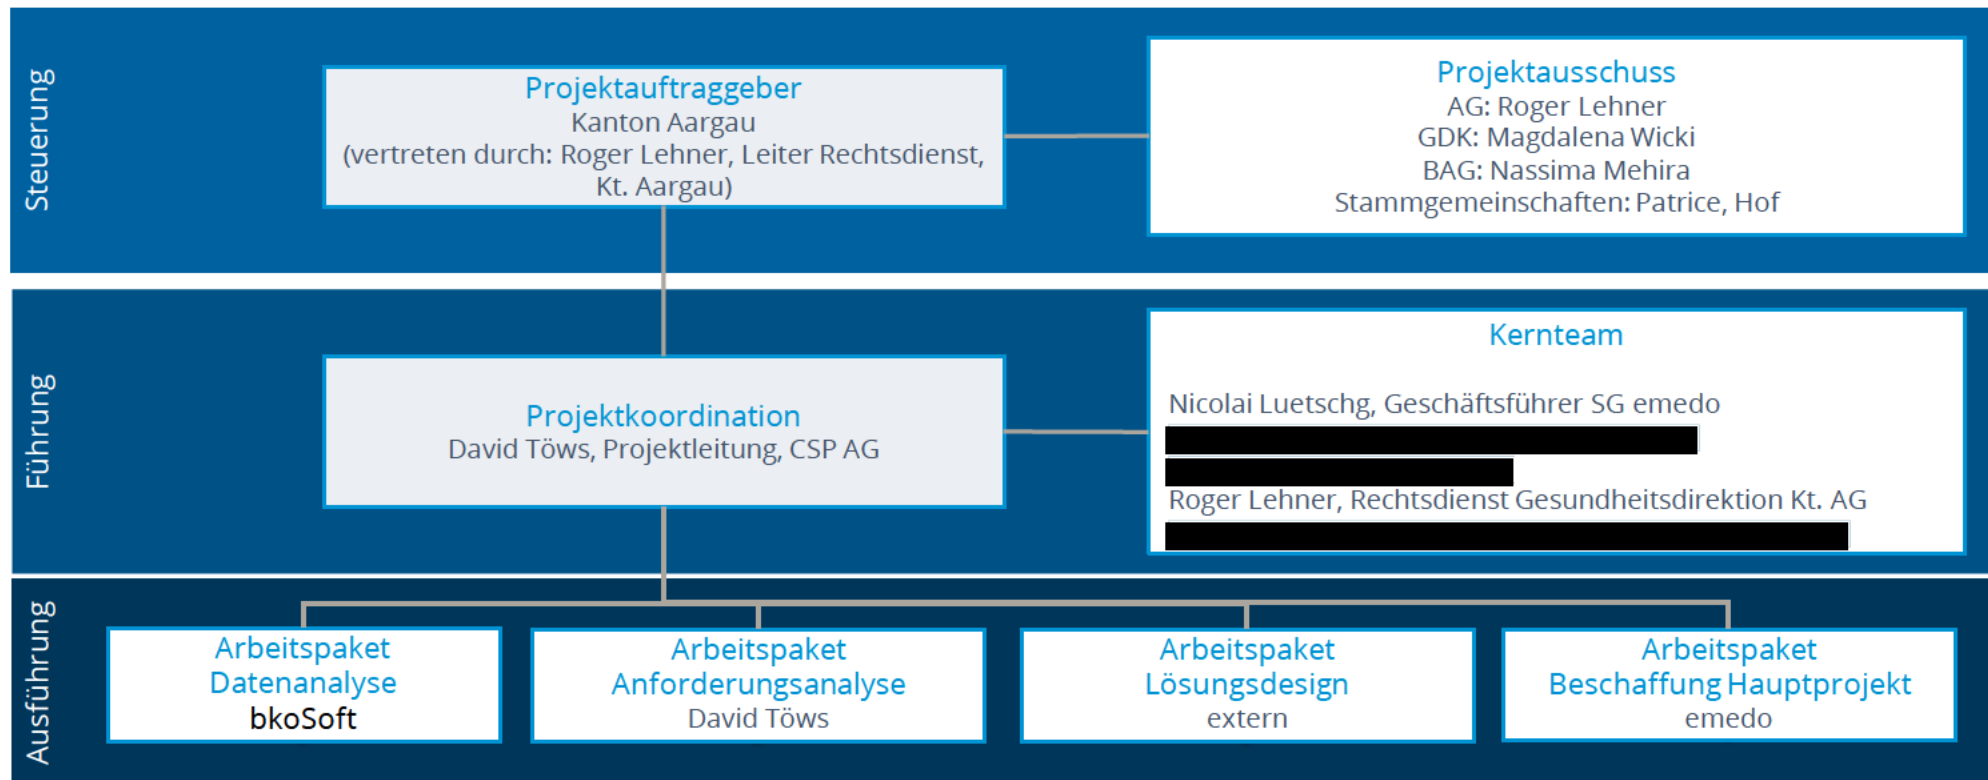


Lieferergebnisse



- Datenanalyse
- Kommunikationsplan
- Entscheidungspapier Go / NOGO
- Projektauftrag Hauptprojekt

- Konzept Datenrückgabe oder Datenlöschung
 - Zielarchitektur
 - Rechtliche Bewertung
 - Bewertung EDÖB
 - Governance Hauptprojekt
 - Finanzierungsplan des Hauptprojekts
 - Offerten für das Hauptprojekt
 - Umsetzungsplan Hauptprojekt

Projektplanung

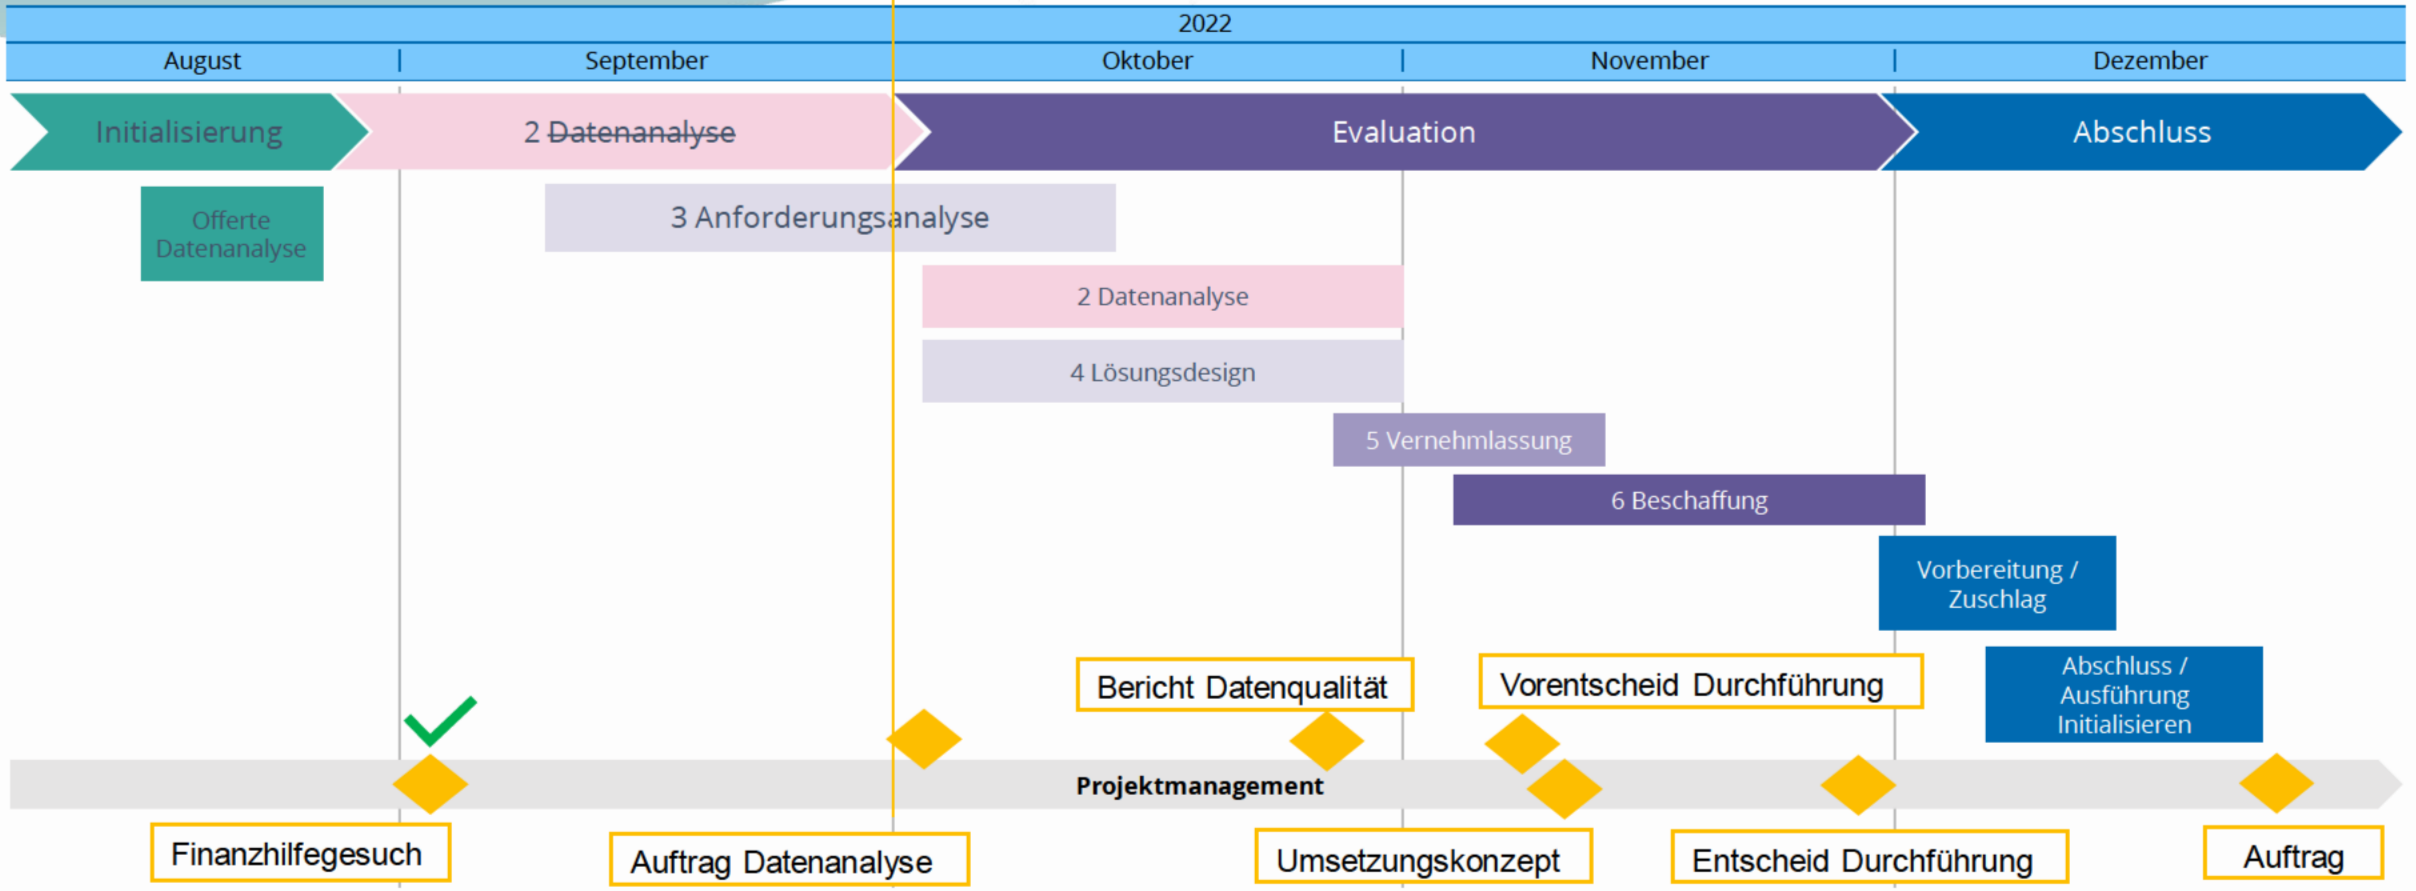

Risiken



Risiko	Beschreibung	Bewertung / Massnahmen
Daten an verschiedenen Orten gespeichert. Datenzugang nicht gesichert.	Bei der Übergabe der Daten wurde eine Harddisk an den Kanton Aargau übergeben. Es sind noch Infrastrukturen bei Providern vorhanden, deren Zugänge nicht klar sind.	Mittleres Risiko , Aargau ist Inhaber der Daten. Dies wurde vom Konkursamt bestätigt und somit konnte der Zugang zu den Infrastrukturen ermöglicht werden.
Bereitgestellte Finanzen nicht ausreichend für die Durchführung des Vorprojekts	Die vom Kanton Aargau und SteHAG zur Verfügung gestellte Finanzierung reicht nicht Projektdurchführung inklusive Projektleitung.	Hohes Risiko , öffentliches Interesse an einer raschen Datenherausgabe rechtfertigt die Investition. Das BAG klärt ob es das Projekt mitfinanzieren können
Hohes Aufkommen von Lösch- oder Auskunftsbegehren		Kommunikation vom aktuellen Stand des Projekts. Begehren werden nicht bearbeitet.
Komplexität der Datenstruktur	Meineimpfungen ist ein gewachsenes System. Die Datenstruktur ist nicht best practice.	bkoSoft hat viel Vorarbeit geleistet. Das Involvieren der Firma wäre vorteilhaft.
Lange Bearbeitungszeiten EDÖB	Leider hat die Erfahrung des letzten Jahres dies so bestätigt.	Involvierung zeitnah und beständig
Finanzierung Hauptprojekt nicht möglich	Der Kanton Aargau kann das Hauptprojekt nicht finanzieren.	Stakeholder müssen involviert werden

Agenda



1	Begrüssung und Vorstellung	15:00 – 15:10
2	Ziele	15:10 – 15:15
3	Vorstellung Projekt	15:15 – 15:35
4	Aktueller Stand	15:35 – 15:40
5	Nächste Schritte	15:40 – 15:50
6	Varia	15:50 – 16:00



Arbeitspaket	Status	Detail
Finanzhilfesuch	Warten	Projektfinanzierung sicherstellen
• Antrag stellen	Erledigt	
• Warten auf Rückmeldung	Warten	
Datenanalyse	Warten	Definition Datenanalyse
• Definition Datenanalyse	Erledigt	
• Offerte bkoSoft	Erledigt	Offerte bkoSoft vorhanden
• Auftrag	Warten	
Anforderungsanalyse	In Arbeit	Anforderungen meineimpfungen <ul style="list-style-type: none"> • Datenschutzrechtliche Anforderungen /EDÖB • Rechtliche Anforderungen • Fachliche und technische Anforderungen • Use Cases und Prozesse • Governance Anforderungen

Agenda



1	Begrüssung und Vorstellung	15:00 – 15:10
2	Ziele	15:10 – 15:15
3	Vorstellung Projekt	15:15 – 15:35
4	Aktueller Stand	15:35 – 15:40
5	Nächste Schritte	15:40 – 15:50
6	Varia	15:50 – 16:00

Nächste Schritte

- Warten auf Finanzierungs freigabe
- Auftrag Datenanalyse auslösen
- Auftrag an Unternehmen für den Vorschlag einer Lösungsarchitektur



Agenda



1	Begrüssung und Vorstellung	15:00 – 15:10
2	Ziele	15:10 – 15:15
3	Vorstellung Projekt	15:15 – 15:35
4	Aktueller Stand	15:35 – 15:40
5	Nächste Schritte	15:40 – 15:50
6	Varia	15:50 – 16:00



- Nächster Termine PA:
 - 09.11.2022 7:30 Uhr
 - 07.12.2022 7:30 Uhr
- Auf welcher Plattform sollen die Kantone informiert werden?
 - Thema wird für die Sitzung vom 24.11.2022 durch die GDK traktandiert (in Absprache mit BAG und Kt. AG)
 - Bis dann sollte klar sein, mit welchen Kosten für das Hauptprojekt zu rechnen ist



ehealth-aargau.ch
info@ehealth-aargau.ch



emedo

emedo.ch
info@emedo.ch



Stammgemeinschaft eHealth Aargau Laurenzenvorstadt 11 5000 Aarau

062 836 40 10
