

Vorprojekt Datenrettung meineimpfungen

Sitzung Projektausschuss

09.11.2022
07:30 Uhr

Teams

Stammgemeinschaft eHealth Aargau

Laurenzenvorstadt 11

5000 Aarau



Teilnehmer

- Roger Lehner (Kanton Aargau)
- Magdalena Wicki (GDK)
- Nassima Mehira (BAG)
- Patrice Hof (Stammgemeinschaften)

- Nicolai Lütschg (Geschäftsführer SteHAG)
- David Töws (Projektleiter)



Agenda



- 1 Übersicht Projektstatus
- 2 Datenanalyse
- 3 Lösungsdesign
- 4 Nächste Schritte
- 5 Varia

Agenda



1 Übersicht Projektstatus


2 Datenanalyse

3 Lösungsdesign

4 Nächste Schritte

5 Varia

Projektstatus

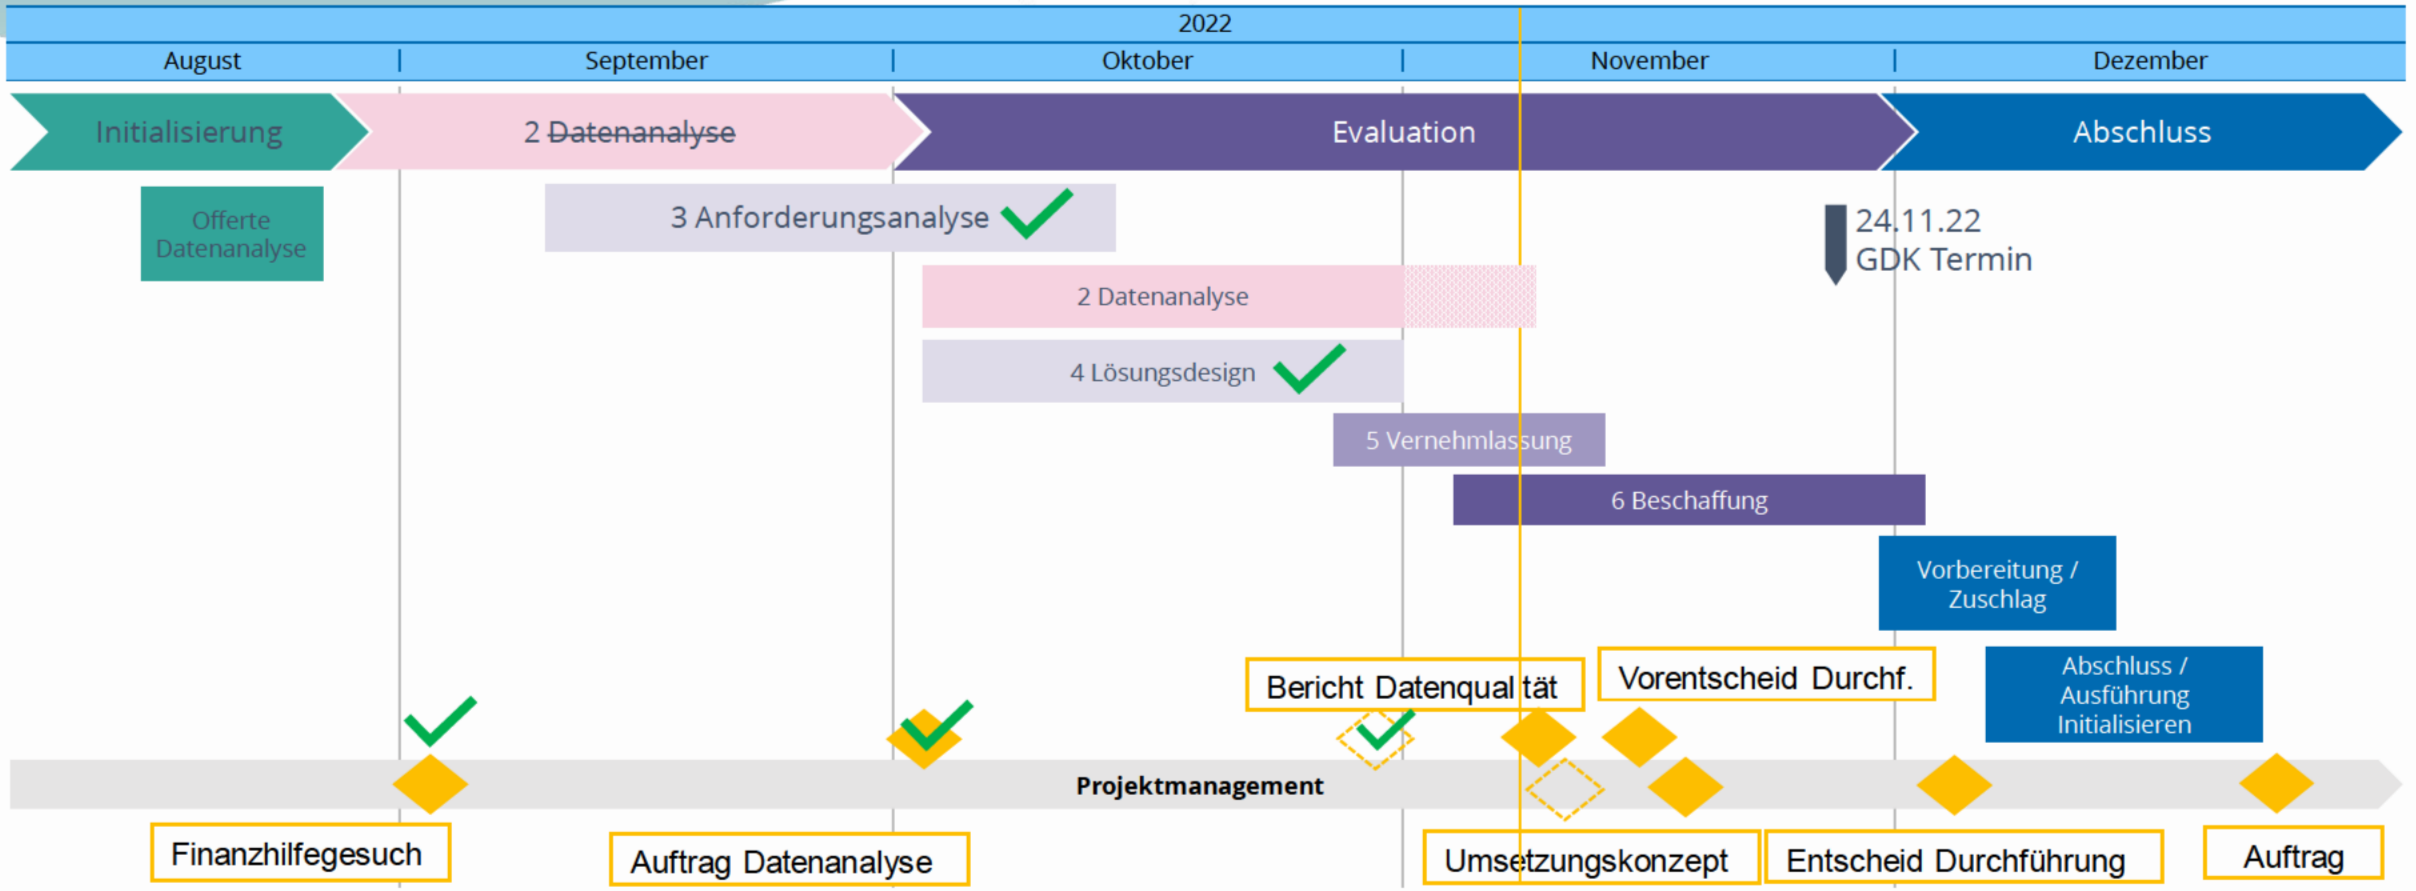

Projektstatus



Arbeitspaket	Status	Detail
Datenanalyse	In Arbeit	Vorbericht vorhanden, Finaler Bericht am 11.11.
Lösungsdesign	Evaluation	Eingereicht, Präsentationstermine 07. / 09.11.22
Beschaffung	In Arbeit	Einschätzung vorhanden, Detailabklärungen in Arbeit. Wahrscheinlich muss ausgeschrieben werden (>50% öffentlich finanziert)
Governance / Finanzierung	In Arbeit	Abhängig von der Beschaffung
Webseite meineimpfungen	In Arbeit	Auftrag erteilt in Arbeit wird Ende Nov. aufgeschaltet
Datenschutzabklärung	In Arbeit	

Agenda



1 Übersicht Projektstatus

2 Datenanalyse

3 Lösungsdesign

4 Nächste Schritte


5 Varia

Datenanalyse

- Datenmodell vorhanden
- Beziehung der Daten dokumentiert
- Anzahl Datensätze, die zurückgegeben werden können sind bekannt
- Identifikationsmerkmale sind bekannt
- **Disclaimer:**
Die medizinische Validierung nicht Teil des Projekts. Dies muss jeder Benutzer mit einer Fachperson vornehmen.
Benutzer konnten auch manuell Einträge vornehmen (645tsd Einträge mit Freitext von 4.4 Mio.).



Datenanalyse



Agenda



- 1 Übersicht Projektstatus
- 2 Datenanalyse

- 3 **Lösungsdesign**

- 4 Nächste Schritte
- 5 Varia

Lösungsdesign

- Fachliche Vorschläge inkl. Preise für Rückgabe der Daten
 - Aktuell 3 Vorschläge
 - Präsentationen 7.11.22 / 9.11.22
 - CHF 200'000.- bis CHF 1 Mio. (Aufbau und Betrieb für 2 Jahre)
 - Entspricht CHF 0.75 bis CHF 3.60 pro Impfdossier
 - Betrifft nur Aufbau & Betrieb der Plattform
- Kosten, wie Kommunikation, Projektleitung, etc. zusätzlich
- Fachexperten zur Beurteilung:
 - [REDACTED] (ahdis GmbH)
 - [REDACTED] (eHealth Suisse)



Agenda



- 1 Übersicht Projektstatus
- 2 Datenanalyse
- 3 Lösungsdesign

- 4 Nächste Schritte

- 5 Varia

Nächste Schritte

- Bericht Datenanalyse EDÖB zustellen.
- Neue Kommunikationskanäle: Webseite Ende November 2022 viersprachig bereit
- Finanzierung: **zu klären** (angestrebt: 50% Bund / 50% Kantone)
- Klärung Notwendigkeit öffentliche Ausschreibung und evtl. Ausschreibung lancieren
- Entscheid Go/NoGo durch Projektausschuss anhand Bericht Datenqualität und der Bewertungen der Vorschläge



Agenda



- 1 Übersicht Projektstatus
 - 2 Datenanalyse
 - 3 Lösungsdesign
 - 4 Nächste Schritte
 - 5 **Varia**
-

Varia



- Nächster Termine PA:
 - 07.12.2022 7:30 Uhr
- Weitere
 - ...



ehealth-aargau.ch
info@ehealth-aargau.ch



emedo

emedo.ch
info@emedo.ch



Stammgemeinschaft eHealth Aargau Laurenzenvorstadt 11 5000 Aarau

062 836 40 10

Backup: New Agenda

